



اسم المقال: مدى توافر متطلبات نظام جودة إدارة المشروع (ISO 10006:2017) دراسة حالة في شركة هندسة المباني للمقاولات بالموصل

اسم الكاتب: م. أحمد طلال أحمد الأفendi

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/3627>

تاريخ الاسترداد: 2025/05/13 19:32 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناءمجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political، يرجى التواصل على

info@political-encyclopedia.org

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام

<https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة تنمية الراشدین كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي يتضمن المقال تحتها.



تنمية الرافدين

العدد ١٢٠ المجلد ٣٧ لسنة ٢٠١٨

مدى توافر متطلبات نظام جودة إدارة المشروع
(ISO10006:2017)
دراسة حالة في شركة هندسة المباني للمقاولات بالموصل

**The Availability Of Project Management
Quality System Requirements (ISO10006: 2017)
A Case Study In The Building Engineering
Company For Contracting In Mosul**

أحمد طلال أحمد الأفandi
مدرس - قسم الادارة الصناعية
كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الموصل

Ahmed T. A. Alafandi

el_afandi2003@yahoo.com

تأريخ قبول النشر ٢٠١٩/١/١٠

تأريخ استلام البحث ٢٠١٨/١٠/١

المستخلص

يسعى البحث الحالي إلى تشخيص مدى توافق متطلبات نظام جودة إدارة المشروع ممثلاً بالمواصفة (ISO10006:2017) في أحدى شركات المقاولات العاملة في مدينة الموصل، نتيجة لانتشار المشاريع في كل أنحاء العالم وزيادة الاعتماد على دور ادارة المشروع سواء في مشاريع البناء والانشاءات او مشاريع انشاء السلع الجديدة باتجاه زيادة مستويات فاعليتها وكفائتها وعلى هذا الاساس فقد حاور البحث موضوعه في ضوء مجموعة من التساؤلات حول متغيراته والتي اختبرت في ما بعد إحصائياً والتي ضمتها قائمة فحص وجهت للقائمين على ادارة الشركة المبحوثة، تم التركيز فيها على المتطلب الثالث "الشروط والتعريفات" والمطلب الرابع "نظم ادارة الجودة في المشروع" ،في ضوء تفسير اجابات المبحوثين تم التوصل إلى استنتاج اساسي وهو ان الشركة المبحوثة لا تمتلك نظم جودة متخصص، بينما اشرت النسبة المئوية المتحققـة من مقارنة جودة ادارة المشروع في الشركة المبحوثة مع المواصفة قيد البحث بجميع فقراتها والتي بلغت (٤٦%) وهي تقترب من "مطبق جزئياً - موثق جزئياً" وفي ضوء ذلك تم تقديم مقررات تخدم تلك الشركة، اهمها هو ضرورة تبني توجـه لاعتماد المواصفة (ISO10006:2017) تحديداً، فضلاً عن تضمين هذا الامر في شروط انشاء الشركات والشروط العامة للمقاولات بالشركات العاملة في هذا المجال بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: نظام جودة ادارة المشروع.

Abstract

The aimed of current research is to identifying the availability of project quality management system requirements, which represent (ISO10006: 2017) specification in a contract company that operating in city of Mosul. The growing number of projects spreading all over the world, leads to increasing reliance on project management in construction projects in order to enhancing their efficiency and effectiveness. In this context, the research was including a set of questions about its variables which were tested statistically. The research included a checklist which was directed to the managers of the company. Definitions of the third and the fourth requirement refer to the quality management systems in the project. According to the interpretation of the respondents' answers, the research concluded that the company did not have a specialized quality system, while the percentage achieved from comparing the quality of project management for the company investigated with the specification indicated(46%), which is mean "partially implemented- partially documented". A number of recommendations have been submitted. The most important of them indicated that there is a need to adopt the standard (ISO10006: 2017). General Contracting for companies operating in this field.

Keywords: Project Management Quality System.

المقدمة

تعد القرارات المتعلقة بإنشاء المشاريع الجديدة من القرارات التي تتطلب إنفاقاً عالياً، اذ اشارت الدراسات انه يتم انفاق ١٢ تريليون دولار على المشاريع من الناتج المحلي العالمي في كل عام، وهذا الاستثمار الهائل يتطلب الحكم والسيطرة الادارية السليمة عليه، مما دفع منظمة المواصفات الدولية (ISO) الى إعداد مواصفة متخصصة في هذا المجال في ضوء استشارة المئات من الخبراء في ادارة المشاريع في (٣٠) دولة ومراجعة الالاف من التعليقات والاقتراحات من المعنيين والمهتمين بهذا الامر، للخروج بهذه من المواصفة (Zandhuis and Stellingwerf, 2013)، ولما كانت الشركات المعنية بالانشاءات والمقاولات في العراق تشكل مرتكزاً تعتمد عليه مشاريع البناء والاعمار والتي يحتاجها البلد للنهوض بواقع الاقتصادي وما يعنيه ذلك من

ضرورة تبني تلك الشركات اطراً متقدمة ترکز على فاعلية ادارتها في ممارساتها وانشطتها، وعلى هذا الاساس يأتي هذا البحث ليقدم مساهمة بحثية ل الوقوف على مستوى اعتماد تلك الشركة للاطر العالمية في ميدان تخصصها، وبشكل عام فقد اطر البحث ليشمل المحاور الآتية :

منهجية البحث أولاً- مشكلة البحث

تنطلق من فكرة مدى توافر متطلبات المعاصفة الدولية المتعلقة بمتطلبات جودة ادارة المشروع (ISO10006:2017) في الشركات العراقية، تمهداً لتطبيقها في المستقبل، وبالتالي الوقوف على مستوى إمكاناتها التي تؤهلها للعمل وفق المعاصفة المبحوثة، وبشكل عام إن مشكلة البحث تتلخص بالإجابة على التساؤلات الآتية بوصفها تعبراً عن تلك المشكلة:

١. ما الواقع الفعلي المتبع لإدارة جودة المشاريع في الشركة قيد البحث؟
٢. مامدى توافر المتطلبات للمعاصفة المبحوثة في الشركة قيد البحث؟
٣. هل هناك فجوة تحول دون التطبيق الفاعل للمعاصفة المبحوثة في الشركة قيد البحث؟

ثانياً- أهمية البحث


تنبع من أهمية متغيراته والمتمثلة بمفهوم جودة ادارة المشروع وفق المعاصفة (ISO10006:2017) والذي سوف يسهم بنشر وتطبيق هذه المعاصفة، اذ ساعدت هذه المعاصفة الكثير من الشركات للوصول الى المستوى العالمي في تنفيذ المشاريع، كذلك تحديد الفجوات بين الواقع الفعلي المطبق مع متطلبات المعاصفة قيد البحث، بغية الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة الشركة المبحوثة.

ثالثاً- اهداف البحث

يهدف البحث الى تقديم اطار نظري وتطبيقي لاكتشاف مديات اعتماد متطلبات المعاصفة المبحوثة وقياس الواقع الفعلي لاداء الشركة عن طريق اعداد قائمة لفحص مدى تطبيق متطلبات بنود هذه المعاصفة وقياس الفجوة بين الواقع الفعلي لاداء الشركة مع متطلبات المعاصفة المبحوثة، وتقديم مجموعة من الاستنتاجات والمقترنات

رابعاً- أنموذج وفرضيات البحث

اعتمد البحث أنموذجاً افتراضياً كما موضح في الشكل ١.

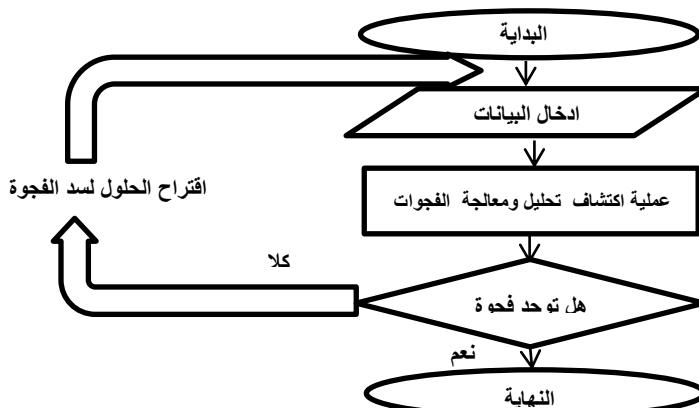

الشكل ١ : الأنماذج الافتراضي للبحث

في إطار نموذج البحث المشار إليه في الشكل ١ فقد تم اعتماد الفرضية الآتية :
 (لا تتوافر متطلبات نظام جودة إدارة المشروع في الشركة المبحوثة)

خامساً- منهج البحث

اعتمد البحث منهج دراسة الحالة والذي يركز على المقابلات الشخصية وقائمة الفحص واللاحظات لجمع البيانات وتحليلها بالاستناد على الاسس العلمية والبحثية لغرض الوصول إلى أهداف البحث.

سادساً- حدود البحث

١. **الحدود المكانية:** اقتصر البحث في تنفيذ جانبه العملي على شركة هندسة المباني بموصى نظراً لتعاون إدارة هذه الشركة مع الباحث من جهة ورغبتها في التعرف على جوانب تطبيق موضوع البحث والاستفادة من نتائجه من جهة أخرى.

٢. **الحدود الزمنية:** حددت مدة البحث بمدة المشروع بتنفيذ فكرة البحث والبدء بزيارة الشركة واجراء عملية الفحص والتحليل الاحصائي والتوصل إلى النتائج، وهي المدة الممتدة من (١٢/٢٠١٨/٩ ولغاية ٢٠١٨/٦).

سابعاً- أساليب جمع البيانات والمعلومات

اعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث على الآتي:

١. **الجانب النظري:** تم اعتماد دراسة وتحليل اصدارات سلسلة المواصفة بموضوع البحث المتمثلة ب(ISO10006:1997) و(ISO10006:2003) و(ISO10006:2017) فضلاً عن المواصفة التوجيهية لإدارة المشاريع (ISO21500:2012) كما تم الاستعانة بالعديد من المصادر الأجنبية المرتبطة بموضوع البحث من أجل تعطية جانبه النظري.

٢. **الجانب العملي:** للحصول على البيانات التي أسهمت في الوصول لأهداف البحث قام الباحث بإجراء زيارات ميدانية للشركة المبحوثة وبعض مواقع العمل المسؤولة عن انجازها واللقاء مع القائمين على إدارة الشركة كما موضح بالجدول ١، كما تم إعداد مجموعة اسئلة* قائمة فحص الملحق ١، إذ بين الجدول ٢ اوزان المقاييس المستخدمة في قائمة الفحص تلك، والتي تم توجيهها إلى المسؤولين عن هذه الشركة.

الجدول ١

معلومات عن الشركة المبحوثة والم مقابلات الشخصية والغاية منها

اسم الشركة المبحوثة	عنوان الشركة و تاريخ التشكيل	عدد المشاريع المنفذة من قبل الشركة	عدد المقابلات التي اجريت معه المقابلة	اسم والعناوين الوظيفي للشخص الذي اجريت معه المقابلة	عدد المقابلات	الغرض من المقابلة
هندسة المباني	موصل / حي الغزلاني وتأسست في ٢٠٠٧	(٣٥) مشروع	٢	مدير الشركة: المهندس محمد اكرم احمد	٣	التعرف على طبيعة عمل الشركة ونوع المشاريع التي تقوم بتنفيذها، والتعرف على طرائق السيطرة على الجودة في نظام العمل لديهم، فضلاً عن الاجابة على اسئلة قائمة الفحص
			٣	المدير التنفيذي: المهندس محمد هاشم احمد		

المصدر: من إعداد الباحث

(*) استبليط الباحث اسئلة الاستبيانة من نص المواصفة المبحوثة

ثامناً- الأساليب والأدوات الإحصائية المستخدمة
 تم الاعتماد على المقياس السباعي كما في الجدول ٢ للتعرف على مدى تطبيق الشركة لمتطلبات المعاصفة المبحوثة، وتم تحليل قائمة الفحص لإجابات المبحوثين باستخدام المؤشرات الإحصائية الآتية:

الجدول ٢

أوزان المقاييس السباعية لدرجة المطابقة مع المعاصفة

وزن الفقرة (الدرجة)	فترات المقياس	ت
٦	مطبق كلياً موثق كلياً	١
٥	مطبق كلياً موثق جزئياً	٢
٤	مطبق كلياً غير موثق	٣
٣	مطبق جزئياً موثق كلياً	٤
٢	مطبق جزئياً موثق جزئياً	٥
١	مطبق جزئياً غير موثق	٦
٠	غير مطبق وغير موثق	٧

المصدر: من اعداد الباحث

١. الوسط الحسابي المرجح: لقياس المطابقة مع متطلبات المعاصفة وكمياتي:

$$\text{الوسط الحسابي المرجح} = \frac{\text{مجموع}(الوزن} \times \text{التكرار}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

٢. النسبة المئوية لمعدل الالتزام بالمعايير = الوسط الحسابي المرجح ÷ ٦

٣. حجم الفجوة لكل قائمة فحص = ١ - النسبة المئوية لمعدل الالتزام بالمعايير

تساعاً- مجتمع البحث وعيته

اقتصر مجتمع البحث على المدير والمدير التنفيذي للشركة وهم يمثلان عينة البحث، وهذا يتتناسب مع طبيعة ومتطلبات قائمة الفحص.

الجانب النظري

بعد قرار إنشاء المشاريع من القرارات المهمة والمفصلية لأي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة، وذلك بسبب حجم الأموال المستثمرة فيه، وهذا الامر دعا الكثير من المراكز البحثية المتخصصة في التدريب والتنمية البشرية واعداد المعاصفات الى اصدار البحوث والكتيبات والمعايير التي تتناول هذا المجال في كل جوانبه، ومنها المعاصفة مجال اهتمام البحث، والتي أسهم في إخراجها مئات الخبراء والعديد من مدراء المشاريع الناجحين واستغرقت صياغتها سنوات طويلة، وتم التتحقق منها واثبات نجاحها، وفي ضوء ما نقدم سوف يتم تغطية هذا المحور كما يأتي.

أولاً- مفهوم المشروع: تعددت الآراء التي تناولت مفهوم المشروع، أذ عرفه (Munns and Bjeirmi, 1996, 81) بأنه "تحقيق هدف محدد يتضمن سلسلة من الانشطة والمهام التي تستخدم الموارد والتي عند اكتمالها يتم تحقق مواصفات محددة سابقاً مع تحديد تواريخ للبدء والانتهاء"، أما معهد (المجموعة الاستشارية للبحوث الدولية*) فعرف المشروع بأنه "مسعى مؤقت يهدف الى إنشاء منتج أو خدمة او نتيجة فريدة" (CGIAR, 2017, 4)، ووصف (Nubyiza, 2015, xiii) المشروع بأنه "نشاط مترابط يحتوي توقعات البدء والانتهاء يتم من خلاله تنفيذ منتج فريد أو خدمة أو نتيجة، ويتم قيادته من قبل مدير التخطيط"، أما (Leyva and Matović, 2011, 21) فعرفوا المشروع بأنه "العملية التي تشمل جميع الاجراءات

(*) Consultative Group for International Agricultural Research

والقرارات قبل قرار الاستثمار النهائي والتي تتضمن الانشطة التي تودي الى وضع حلول لمجموعة من الاحتياجات والرغبات او المشاكل لأصحاب المصالح او الطرف المستفيد وتبدأ عملية التصميم بتحديد احتياجات أصحاب المصلحة، ومن ثم ترجمتها الى معايير وتطویرها ثم تنفيذها واخيراً تسليمها بالشكل الذي يرضي الطرف المستفيد من المشروع"، في حين أشار قسم تكنولوجيا المعلومات في جامعة (Bridge water state university) "بأنه مسعى مؤقت له تاريخ للبدء وللانتهاء يتم تنفيذه لإنشاء منتج فريد ضمن قيود محددة، وينتهي عند تحقيق الهدف الموضوعة له، ويجب أن يتضمن ما يأتي: مسعى فريداً (غير متكرر)، توقيت بدء وتوقيت انتهاء، اساليب الاستثمار والتسليم للمشروع محددة ومعروفة بوضوح، يتم تنفيذه من قبل فريق مؤقت ومحدد الكلفة، وجود مدير للمشروع يكون مسؤولاً عن نجاحه او فشله، الغايات والاهداف الواجب تحقيقها محددة بصورة دقيقة ومتفق عليها" (Cronin, 2015, 5)، "بينما تعرفه المواصفة (ISO 21500) بانه "مجموعة فريدة من العمليات والتي تكون من انشطة منسقة ومضبوطة من تواريخ بدء وتاريخ انتهاء ويتم تنفيذه لتحقيق هدف محدد، ولتحقيق الهدف يجب تحقيق نتائج تتفق مع متطلبات المواصفات بما في ذلك قيود متعددة مثل الوقت والتكلفة والموارد (ISO 21500: 2012, 3)." .

في ضوء ما تقدم يرى الباحث ان المشروع هو مجموعة من العمليات المخططة بصورة دقيقة لتنفيذ عمل ما والذي بتحقيقها ينجذب المشروع، وهذه العمليات فريدة من نوعها يتم في الغالب تصميمها لذلك الهدف المتتفق عليه مع الجهة المستفيدة والتي سوف ترصد له الاموال والوقت والموارد وتختر طرفاً محدداً لتنفيذها.

ثانياً- إدارة المشروع

عرفها (81, Munns and Bjeirmi, 1996) "بأنها عملية التحكم في تحقيق اهداف المشروع من خلال الاستفادة من الهياكل التنظيمية والموارد المتاحة وتطبيق مجموعه من الادوات والتقنيات دون الاضرار بالعملية الروتينية للمنظمة، وتشمل وظيفة إدارة المشروع تحديد متطلبات العمل، وتحديد نطاقه وتصنيص الموارد المطلوبة، والتخطيط لتنفيذها، ومراقبة تنفيذه ومراقبة تقدمه، وتعديل الانحراف عن الخطة والتي سوف تعود بالنفع العام للشركة" ، اما (Nubyiza, 2015) xiii فيراها "بأنها تطبيق للمعرفة والمهارة والادوات والتكنولوجيا في انشطة المشروع لتلبية انجاز احتياجات أصحاب المصالح". الى ان المواصفة (ISO 21500:2012, 3) عرفت ادارة المشروع بأنها "تطبيق الاساليب والادوات والتقنيات والكافاءات في كل مراحل المشروع لكي يتم تنفيذ وتكامل كل مراجعة" ، في حين ترى منظمة تنمية ادارة المشاريع* (PM4DEV) ادارة المشروع بانها "عملية قيادة فريق من الاشخاص القادرين على اداء الاعمال المتمثلة بالتخطيط والتنفيذ وفق سلسلة من الانشطة ذات الصلة والتي يجب ان تتجز في تاريخ محدد بميزانية محدودة، وهذا الامر يتطلب تنسيقاً عالياً والذي يبدأ باستكشاف المشروع والافتراضات التي تدرج حوله وتقدير المخاطر وخطط الطوارئ والمراقبة الوثيقة للميزانية والنطاق والجدول الزمني وذلك لتحقيق اهداف المشروع في ظل الجودة المتواقة، ويحتاج كل عنصر من العناصر السابقة الى ادارة وخطط وتحديد الادوار الواجبة على كل شخص وفي كل مرحلة من مراحل انشاء المشروع (PM4DEV, 2015, 3)." . وهنا لابد من توضيح حقيقة مهمة وهي ان وجود ادارة منضبطة للمشاريع هي السبيل للتغلب على اوجه القصور، اذ إن قيمة الممارسة الجيدة لإدارة المشروع سوف تمكّنه من التعامل الأفضل مع الحالات الطارئة بشكل استباقي وهذا سوف يزيد وبشكل كبير من فرص نجاح

المشروع، وإن نجاح اي مشروع يحتاج الى ادارة مستوعبة للأدوار الواجب عليها القيام بها والمتمثلة بالاتي: (Zandhuis and Stellingwerf, 2013, 17-19)

١. **حفة الوصل:** يعد مدير المشروع حفة الوصل مع الطرف الممول للمشروع (المستفيد) وهو الذي يعلم بالغرض او الغاية من انشاء المشروع، فهو الشخص الذي سوف يستلم المشروع من الطرف المستفيد مع ضمان التزام الطرف الثاني بقراراته بمنع التغيرات المستمرة التي تؤدي الى تخبط الاعمال اليومية، كما يضمن الحصول على التخصيصات المالية للمشروع وعدم توقيتها.

٢. **تشخيص التغيرات:** مدير المشروع هو المسؤول في نهاية المطاف عن تحقيق هدف المشروع ونتيجة اتصاله بالجهة المستفيدة وقدرته على توجيه فريق المشروع، فهو قادر على تشخيص التغيرات والمشكلات سواء كانت اخطاء في التصميم او غيرها والتي تؤدي الى عدم نجاح الهدف المرجو من المشروع والاشارة إليه ونقله الى الطرف المستفيد من المشروع والاتفاق على معالجتها، اذ في بعض الاحيان تتطلب المعالجة تخصيصات مالية اضافية او تغيرات طارئة في التصميم.

٣. **الاستشارة وتقديم الخبرات:** مدير المشروع هو احد الاعضاء في فريق انشاء المشروع في الجهة المستفيدة وهذا يجعله من الاطراف التي تكون مسؤولة عن تقديم الخبرات في كل مراحل المشروع مثلً التخطيط واعداد التصميم وتحديد الاولويات والاحالة ومن ثم طرائق التسلیم، وهذا الامر سوف يسهل عملية استلام المشروع المنجز من قبل الطرف المستفيد، وهذا يتطلب مهارات محددة اشارت اليها المواصفة (ISO 21500:2012:7-8) وهي:

- **الكفاءة الفنية:** لتسليم المشاريع من خلال تطبيق عمليات ادارة المشروع وهيلته وطريقه تنفيذه.

- **الكفاءة السلوكية:** وتشير الى القدرات المطلوبة لبناء وتعزيز العلاقات والتي تعود بالفائدة على المشروع وتحقيق البيئية التنظيمية الناجحة له.

- **الكفاءات السياقية:** والتي تتعلق بترجمة اهداف المشروع وتعديلها وفق الفائدة المرجوة منه.

ثالثاً- عمليات ادارة المشروع

بينت الدراسات التي اجريت على العديد من مدراء المشاريع (Pm4dev, 2015, 4-14) (Meredith et al, 2015, 8) (CGIAR, 2017, 7) ان هناك مجموعة من العمليات تؤديها الاغلبية العظمى منهم، وتتألخص بتنسق عمليات يمكن تطبيقها في اغلب المشاريع وهي كالتالي:

١. **ادارة المجال:** ينطوي تحت هذه العملية تعريف وتوثيق ما هو مطلوب او غير مطلوب في المشروع والتي تتضمن الاهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بكل هدف من الاهداف والتي من خلالها يتم مراقبة عملية تحقيقه ومستوى تقدم العمل فيه وتعود هذه العملية من العمليات المهمة التي يعتمد عليها نجاح المشروع من فشله.

٢. **ادارة الجدول الزمني:** وتتضمن الاجراءات المطلوبة لضمان إكمال المشروع في الوقت المناسب والتي تضمن وضع جدول زمني لتنفيذها يحتوي على جميع انشطة المشروع من البداية الى النهاية وكل نشاط من الأنشطة، ويفضل تحويلها بصورة مخطط بياني سهل الفهم لكي يتم استيعابه من قبل الادارة العليا واصحاب المصالح.

٣. **ادارة الميزانية:** وتعد من العمليات المهمة والمؤثرة على ضمان انشاء المشروع وهي اكثر عملية تجرى عليها عمليات تدقيق، فهي ليست مقياس لسلوك المنظمة فقط بل مقياس لكتفاتها ومستوى ادارتها للمخاطر التي تواجهها، اذ أن عدم ادارة هذه العملية بصورة دقة قد يؤدي الى اختلاس الاموال او الفشل وتحقيق خسائر والتي تنسحب الى عدم اكمال المشروع.

٤. إدارة الجودة: هي عملية التأكيد من ان المشروع سوف يلبي احتياجات المستفيدين، ويتم تعريف الجودة في هذا المجال بالالتزام بتقديم مخرجات المشروع بحسب رغبة المستفيدين، وذلك لأن الجودة تحدد في النهاية من قبلهم، فهي تمثل الوفاء بالتعهد الذي قطعه مدير المشروع في البدء من حيث التسليم بالوقت المحدد ومدى ملاءعته للظروف ومستوى الاستفادة من المشروع، وتوضح هذه العملية على شكل معايير ذات صلة بالمشروع في البدء في مرحلة التفاوض بين إدارة المشروع والجهة المستفيدة.

٥. إدارة الفريق: وهذا يتعلق بإنشاء قائمة تحدد المهارات التي يحتاجها المشروع وقد تتمثل بمهارات عالية الكفاءة او دعم اداري وغيرها من المستويات المهنية ويتم الحصول على القوة العاملة بالاعتماد على الموارد البشرية التابعة للشركة او عن طريق التعيين او التعاقد قصير الأمد، ومن ثم يتم تحديد المهام التي سوف يقومون بها بصورة دقيقة وبناءً على هذه المهام يخصص لهم أحياناً دورات تدريبية من أجل رفع مستوى مهاراتهم ويجب تقييمهم بشكل دوري خلال عمر المشروع.

٦. إدارة أصحاب المصالح: تعد هذه الادارة أحد أهم المجالات التي تتلقى أقل قدر من التفكير والتخطيط، ويرجع هذا الامر الى الفهم المحدود حول من هم أصحاب المصلحة؟ وما هو دورهم في المشروع؟، واصحاب المصلحة هم جميع الاشخاص الذين لديهم شأن في المشروع وهم العنصر الاكثر اهمية في انجاح المشروع وتشمل الجهات المانحة والمستفيدة والحكومات المحلية والمنظمات الشريكية، واي شخص سوف يتاثر بالمشروع، وبالطبع تختلف قائمة أصحاب المصلحة بين مشروع واخر، وهي ليست مهمة سهلة اذ تتمثل بتحسين العلاقة بين المشروع واصحاب المصلحة ويتم ذلك عن طريق اتباع نهج استباقي يبقى الثقة بين جميع الاطراف وكلّاً بحسب حجمه ومستوى تأثيره.

٧. إدارة المعلومات: وتشمل العمليات الالازمة لضمان توليد المعلومات الخاصة بالمشروع وجمعها ونشرها وتخزينها والتخلص النهائي منها في الوقت المناسب، اذ يتم انفاق ٨٠٪ من وقت مدير المشروع في التواصل عبر التقارير والبريد الالكتروني والهاتف والاجتماعات والعروض التقديمية وتكون هذه العملية مرتبطة بالعملية السابقة لكون اغلب التقارير والمعلومات المستخلصة من البيانات سوف تقدم لأصحاب المصالح وتقدم هذه الادلة المعلومات الالازمة عن مستوى تقدم المشروع والمستوى المالي ومدى التزام ادارة المشروع بالقوانين والأنظمة والمعايير المنتفق عليها، وكلما كانت المعلومات المستقاة من هذه العملية جيدة تم الحصول على دعم أصحاب المصلحة.

٨. إدارة المخاطر: وهي المعنية بتحديد مخاطر المشروع وتحليلها والرد عليها ويتم تعريف المخاطر في المشاريع على أنها شيء غير مرغوب قد يحدث وإذا حدث ذلك سوف يكون له تأثير سلبي على المشروع وت تكون إدارة المخاطر من اربعة مراحل في تخطيط ادارة المشروع وهي (١-تحديد المخاطر. ٢-تحليل المخاطر. ٣-المراقبة. ٤-التحديد الكمي .) . المراقبة والاستجابة للمخاطر عن طريق المعرفة المكتسبة لدى ادارة المشروع.

٩. إدارة العقود: وتتضمن كافة العمليات المطلوبة للحصول على المنتجات والخدمات التي يحتاجها المشروع من قبل طرف ثالث وبالنسبة لمعظم المشاريع عادة ما تتم ادارة عمليات الشراء من خلال دعم وظيفة ادارية داخل المنظمة، ويتم تحديد الاحتياجات بصورة تفصيلية وتحتوي على المواصفات الفنية والكمية وتاريخ الحاجة اليها، وتنتمي بعد من المراحل وهي (وضع الخط للتوريد، تنفيذ الخطة، مراجعة الخطة، واخيراً تطوير الخطة لتكون جاهزة لاستخدامها مرة اخرى).

رابعاً- الموصفة الدولية ISO10006:20017

يطلق على هذه الموصفة تسميات "إدارة الجودة، مبادئ توجيهية لإدارة الجودة في المشاريع" وتم اصدارها في تشرين الثاني عام ٢٠١٧ وهي الاصدار الثالث لهذه السلسلة من الموصفات حيث سبقتها (ISO10006:2003) و(ISO10006:1997) وتكملاً للإرشادات الواردة في الموصفة (ISO21500:2012) وتنماشى مع الموصفة (ISO 9000:2015) والموصفة (ISO9001:2015) إذ كل هذه الموصفات تستند بالأساس على المبادئ السبعة لإدارة الجودة وهي (١. التركيز على الزبون. ٢. القيادة. ٣. اشراك العاملين. ٤. نهج الادارة. ٥. التحسين المستمر. ٦. صنع القرار القائم على الاadle. ٧. إدارة العلاقات) وتعد من الموصفات واسعة النطاق (اي يمكن استخدامها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً). وت تكون من المتطلبات الرئيسية الآتية: (١-المجال. ٢-المراجع المعيارية (القياسية). ٣-الشروط والتعرifات. ٤-نظم ادارة الجودة في المشروع) وسوف يتم التركيز في هذه البحث على كل من المتطلبات الثالث والرابع فقط لكون المتطلبان الاول والثاني يوضحان نطاق عمل الموصفة والمراجع المستخدمة في اصدارها، مع الالتزام بما احتواه هذا الاصدار* ، ونقدم فيما يأتي تعريفاً لمضامين بنودها.

المطلب الثالث: الشروط والتعرifات

(١:٣) النشاط: تحديد النشاط الذي يجب الاضطلاع به لإكمال مشروع

(٢:٣) تقييم التقدم: تحديد نقاط تقييم التقدم المتحقق في إنجاز المشروع وينبغي ان يكون التقييم في المراحل المناسبة من دورة حياة المشروع وعبر عمليات المشروع، وبناءً على معاير عمليات المشروع والمنتج أو الخدمة، والتي قد تؤدي إلى مراجعة خطة إدارة المشروع.

(٣:٣) وصف المشروع

١. هو مجموعة من الانشطة المتسلسلة والمحددة وفق تواريخ ثابتة (تاريخ البدء والانتهاء) يتم التركيز فيها على المطابقة بين المخطط والفعلي سواء بقيود الوقت او الكلفة او الموارد.
٢. يمكن ان يكون المشروع مستقلاً او جزءاً من مشروع كبير لديه بداية ونهاية، وتخالله بدايات ونهائيات كمشروعات صغيرة وبإنجازها يكمل المشروع.
٣. من الممكن تحديث الاهداف ونطاق الخصائص للمشروع تدريجياً اثناء التنفيذ.
٤. يمكن ان تكون مخرجات المشروع واحدة او اكثر سواء ان كانت منتجات او خدمات.
٥. عادة تكون منظمة المشروع مؤقتة ويتم انشاؤها طول مده المشروع .
٦. ليس بالضرورة ان يكون مستوى التعقيد بين الانشطة مرتبط بحجم المشروع.

(٤:٣) إدارة المشروع: التخطيط والتنظيم والمراقبة لجميع جوانب المشروع مع التحفيز لجميع الاطراف نحو تحقيق اهداف المشروع.

(٥:٥) خطة إدارة المشروع: وثيقة تحدد ما هو ضروري لتحقيق اهداف المشروع، ويجب أن تتضمن خطة ادارة المشروع او تشير الى (الهيكل التنظيمي، الموارد، الجدول الزمني، الميزانية، ادارة المخاطر، الادارة البيئية، الصحة والسلامة، وادارة الامان)

(٦:٣) منظمة المشروع: وهو هيكل اداري مؤقت مسؤول عن انشاء المشروع، ويجب ان يحدد فيها ادارة المشروع والمسؤوليات ومستويات السلطة والحدود بينها وذلك من اجل التعريف وابلاغ جميع الاطراف المعنية بالمشروع .

(٧:٣) مراحل المشروع: تقسم دورة انشاء المشروع على مجاميع من الانشطة مثل التصور والتطوير والتنفيذ والانتهاء.

* جميع النصوص والمعلومات في البنود مصدرها الموصفة الدولية (ISO10006:2017)

(٣:٨) **دورة حياة المشروع:** مجموعة محددة من المراحل من البداية حتى نهاية المشروع

(٣:٩) **خطوة الجودة:** تحديد الاجراءات والمسؤوليات والموارد المرتبطة بها والواجب تطبيقها، للحصول على مستوى الجودة المتوقع عليه، وجودة المخرجات هي مسؤولية ادارة المشروع وعدم تلبيتها يمكن ان يكون لها تأثير كبير على منتجات المشروع وخدماته.

(٣:١٠) **المورد او المجهز:** وهي الاطراف المسئولة عن توفير ما يحتاجه المشروع سواء كان منتجًا أو خدمة، ويمكن ان يكون المجهز داخلياً او خارجياً، في بعض حالات التعاقد الخارجي يطلق على مقدم الخدمة بـ المقاول.

المطلب الرابع: نظم جودة ادارة المشروع

(٤:١) **السياق وخصائص المشروع**

(٤:١) **عام:** يجب على منظمة المشروع تقدير السياق الذي تعمل فيه ادارة الجودة الخاصة بالجهة المستفيدة من المشروع وذلك لتجنب المشاكل الناتجة عن اختلاف انظمة الجودة الاساسية للمشروع والذي سوف يساعدها في توفير الفرص للعمل بفعالية اكبر مع الاطراف الداخلية والخارجية والذي سوف يدعم المشروع الناشئ، وهذا يجب التركيز على الاتي:

- فهم احتياجات وتوقعات الاطراف المعنية بانشاء المشروع .
- انشاء عمليات جودة ادارة المشروع اللازمة لتحقيق النتائج في المشروع المنشئ.
- تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بعمليات المشروع والنتائج المقررة له،

(٤:٢) **المنظمات:** توضح هذه الموصفة وبشكل مفصل منظمة المشروع المكلفة بإنشائه والمنظمة المستفيدة والمملوكة له والتي تقرر القيام به، ويمكن ان تكون منظمة واحدة لمشروع صغير او مشروع مشترك او تقوم المنظمة بتعيين شركة اخرى لتنفيذ المشروع، ويجب تحديد المسؤولية والسلطة بشكل واضح ودقيق بين منظمة المشروع والمنظمة المستفيدة والاطراف المعنية والاخرى ذات الصلة، ويتم الحفاظ عليها كمعلومات مؤتقة.

(٤:٣) **المراحل والعمليات في المشروع:** تعد المراحل والعمليات مصطلحين مختلفين في ادارة المشروع، إذ يمكن تقسيم المشروع الى عمليات متراكبة والى مراحل كوسيلة للتخطيط ورصد تحقيق الاهداف وتقدير المخاطر ذات الصلة، وتقسم مراحل المشروع (دوره حياة المشروع) الى عدد من الانشطة مثل المفهوم والتطوير والادراك والانهاء، اما عمليات المشروع: فهي تلك العمليات الضرورية لإدارة المشروع واللازمة لتحقيق منتج او خدمة للمشروع.

(٤:٤) **عمليات إدارة المشروع:** تشمل إدارة المشروع التخطيط والتنظيم والرقابة واعداد التقارير لعمليات المشروع بما فيها اتخاذ الاجراءات التصحيحية والتحسين اللازم لتحقيق اهداف المشروع وفق اسلوب التحسين مستمر، وبالتوافق مع مواصفات ادارة الجودة (ISO 9001:2015) والمواصفة التوجيهية الارشادات حول ادارة المشاريع والعمليات (ISO 21500:2012).

(٤:٥) **مبادئ ادارة الجودة:** تستند ارشادات ادارة جودة المشاريع الواردة في هذا البند الى سبعة مبادئ لإدارة الجودة وفق (ISO:9000:2015 , 3,2) وتمثل: (١. التركيز على الزبون . ٢. القيادة . ٣. اشراك العاملين . ٤. نهج الادارة . ٥. التحسين المستمر . ٦. صنع القرار القائم على الادلة . ٧. ادارة العلاقات)، ويجب ان تشكل هذه المبادئ اساساً لأنظمة ادارة الجودة لكل منشأ او منظمة او مشروع.

(٤:٦) **عمليات جودة إدارة المشروع :** من الضروري ادارة عمليات المشروع ضمن نظام ادارة الجودة من اجل تحقيق اهداف المشروع، إذ تعمل منظمة المشروع داخل المنظمة المستفيدة،

ويجب ان تتم مواءمة نظام جودة ادارة المشروع مع ادارة الجودة للمنظمات المستفيدة منه، اما في حالة اعطاء جزء من عمليات تنفيذ المشروع لطرف خارجي فيجب على منظمة المشروع التأكد من قدرة الطرف المنفذ الجديد على التفاعل وتقديم خدمة المعلومات الموثقة اللازمة والتي تحتاجها منظمة المشروع لضمان فعالية التخطيط والرقابة والتنفيذ وفق سياسات نظام الجودة المتبعة.

(٤،٤) **خطة الجودة للمشروع:** يجب توثيق نظام ادارة الجودة للمشروع والمحافظة عليه وأدراجه او الاشارة إليه في خطة جودة المشروع، ويجب ان تحدد الموارد الازمة لتحقيق الجودة واهدافها ودمجها مع خطط الجودة في المشروع من اجل الرجوع اليها عند التخطيط من قبل الادارة، وعند التخطيط للجودة وتطويرها يجب على ادارة منظمة المشروع والادارة في المنظمة المستفيدة التفكير في المخاطر القائمة على تنفيذ المشروع والتي تعيق تنفيذ الاهداف من اجل معالجتها والتقليل من عواقبها، في حالة التعاقد الخارجي يجب ان تحدد هذه المتطلبات للشركة المنفذة للمشروع.

خامساً. فوائد نظم ادارة الجودة في المشروع

من اجل انجاح تطبيق ادارة الجودة في المشاريع يجب ان يكون التطبيق متزامناً مع تطبيق مواصفات اخرى، اذ ان مواصفة اداره المشروع(موضوع البحث) هي مواصفة تدور في فلك المواصفة الدولية "ادارة الجودة، الأساسيات والمفردات (ISO9000:2015)" والمواصفة "نظم ادارة الجودة، المتطلبات الأساسية (ISO9001:2015)" وتكملاً للإرشادات الواردة في المواصفة "ارشادات ادارة المشاريع (ISO21500:2012)" وتستخدم منهجهة (PDCA) نفسها والتي هي اختصار لكلمات الإنكليزية (plan-do-check-act)(خطط، افعل، تحقق، نفذ، وان تطبق هذه المواصفات في مجال ادارة المشاريع بشكل عام سوف يتحقق الفوائد الآتية: Kristinsdóttir and

(Macek, 2010,273) and Möller, 2014, 192)

١. تسليم المشروع بالشكل المتفق عليه من خلال التخطيط السليم والمبني والقدير الواقعي للتوقيتات لكل مرحلة من مراحل المشروع.
٢. السرعة في التسليم من خلال استخدام عمليات لإدارة المشروع شائعة ومعروفة
٣. تقليل المفاجأة خلال تنفيذ المشروع.
٤. تحسين رضا الزبائن من خلال تقديم المنتج او الخدمة الصحيحة والوقت المناسب.

كما ان هناك فوائد اخرى على مستوى المنظمة المنفذة للمشروع تحديداً هي: Weaver,

(Patrick, 2016, 3)


١. المساعدة في نقل المعرفة والخبرات بين المشاريع والمنظمات الرائدة والناشئة
٢. تحسين خطوات تسليم المشروع.
٣. عملية الحصول على المناقصات أكثر كفاءة وفاعلية من خلال استخدام عروض واقعية.
٤. تمكين المنظمات متعددة الجنسيات من تنسيق إدارة مشروعاتها بصورة شاملة وكفوءة.
٥. تسهيل تنقل موظفي إدارة المشروع وقدرتهم على العمل على المشاريع الدولية وتكون فريق ملتزم ومحمس للغاية يمكنه العمل معًا من خلال التواصل الفعال والاهداف المشتركة.
٦. عملية صنع القرار شفافة ومحسنة على كافة المستويات التنظيمية وتمتاز بالتواصل الفعال في كل المستويات الادارية.

في حين يرى (Zandhuis and Stellingwerf) ان تطبيق مواصفة ادارة المشاريع تجبر الادارات نحو التركيز على مجموعة من الامور والعديد من المنظمات لا تأخذها بالحسبان وهي

- مهمة جداً وتوثر على أرباح الشركة وسمعتها وهي تشمل الآتي: (Zandhuis and Stellingwerf, 2013, 16)
- التأخير واللامبالاة في اعداد الموازنات التفصيلية من قبل ادارة المشروع لكلف التنفيذ مع عدم مراعات الرغبات التفصيلية لصاحب المشروع.
 - يتم تقييم مستوى التنفيذ في المشاريع من قبل الادارة مبنية على خبراتهم او آرائهم الشخصية دون وجود معايير ثابته او تقييمات محددة للتقييم.
 - اعتبار تكاليف ادارة المشروع نفقات عامة بدلاً من الاعتراف بها كقيمة تجارية.
 - لا يتم حساب تكاليف القوة العاملة من داخل المنظمة المكلفين من قبل المنظمة المستفيدة ويقومون بخدمة المشروع والذين يؤدون عملهم الاساسي فضلاً عن الى العمل في المشروع.
 - عدم توفر رؤية شاملة حول المشاريع الجاري تنفيذها من قبل المنظمة من حيث حجم التكاليف مع حجم القيمة المضافة لها.
 - الاعمال الواجب تنفيذها بصورة استباقية غير محددة في خطط المشروع.
 - قد تنجح المشاريع في النهاية لكن من خلال الضغط الشديد والاعمال الاضافية لعدم الاهتمام بهذه الخطوات الاساسية.

الجانب العملي اولاً- الواقع الحالي

من أجل الالام بكل جانب تطبق هذه المواصلة وتشخيص الفجوات بين الواقع الفعلي للأساليب المطبقة في ادارة المشاريع ومتطلبات المواصلة المبحوثة البند (٣و٤)، فان الشكل ٢ يلخص الواقع الفعلي المتبع في احالة وتنفيذ المشاريع في الشركة قيد البحث:

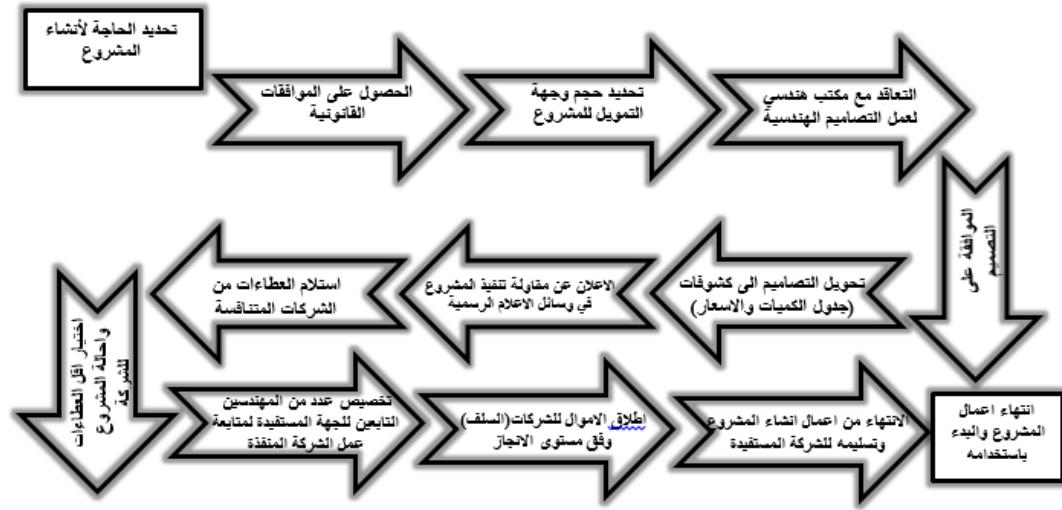

الشكل ٢

واقع تنفيذ المشاريع في الشركة المبحوثة

المصدر: من اعداد الباحث والاستناد على المقابلات الشخصية

ثانياً- اختبار فرضية البحث

من أجل التعرف على مدى توافر متطلبات المعاصفة في الشركة قيد البحث استخدم الباحث اسلوب قائمة الفحص وكانت اجابات الافراد المبحوثين ازاء معايير كل متطلب من متطلبات التي اعتمدتها البحث كما في الجدول ٣:

أ- المتطلب الثالث: الشروط والتعريفات

الجدول ٣

اجابات الافراد المبحوثين حول متطلب الشروط والتعريفات

الشروط والتعريفات	(٣،١)،(٣،٢)،(٣،٣)،(٣،٤)،(٣،٥)،(٣،٦)،(٣،٧)،(٣،٨)،(٣،٩)	ت
١ يتم تحديد معايير دقيقة لتقدير الانجاز المتحقق في كل مرحلة من المشروع	/	
٢ يتم تحديد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من المشروع بصورة دقيقة	/	
٣ تعمل الادارة على تحفيز الاطراف المعنية بانشاء المشروع بصورة فاعلة	/	
٤ خطة ادارة المشروع واضحة ومحددة	/	
٥ الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع محددة فيه بدقة الصالحيات والمسؤوليات	/	
٦ يتم تحديد الميزانية اللازمة لانشاء المشروع بصورة دقيقة	/	
٧ خطط السلامة والامان محددة بصورة دقيقة	/	
٨ هناك فهم واضح من قبل الادارة عن الهدف من اقامة المشروع	/	
٩ هناك فهم واضح من قبل الادارة عن مستوى الجودة المطلوبة في المشروع	/	
الاوزان	٠ .١ .٢ .٣ .٤ .٥ .٦	
النكرار	٣	
النتيجة	٣	
معدل التطبيق	٣،٤٤	
النسبة المئوية	٠،٥٧	
حجم الفجوة	٠،٤٣	

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على اجابات الافراد عينة البحث

يؤشر الجدول ٣ حصول الشركة المبحوثة على (١٢) نقطة لفقرتين تتعلق بتحديد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء من المشروع بصورة دقيقة وكذلك فقرة التحديد الدقيق لميزانية المشروع، كما حصلت على (١٦) نقطة عن فقرات تتعلق باهتمام الادارة بتحفيز الاطراف المعنية بانشاء المشروع ووضوح خطة انشاء المشروع و مستوى الفهم من قبل الادارة عن الغاية من اقامة المشروع ومستوى الجودة المطلوبة فيه، كما حصلت على (٣) نقاط عن فقرة تحديد خطط السلامة والامان، وبذلك فهي تمثل درجة بعيدة عن نص المعاصفة الخاصة بنظام ادارة جودة المشاريع، اذ بلغ معدل التطبيق (٤،٣) في حين كانت النسبة المئوية لمعدل الالتزام (٥٧٪) مما خلق فجوة مقدارها (٤٣٪)

٢. المتطلب الرابع: نظم جودة ادارة المشروع*
أ. فحص متطلب السياق وخصائص المشروع: كانت اجابات المبحوثين ازاء مضمون هذا المتطلب كما موضح في الجدول ٤.

الجدول ٤

الآراء حول مطلب السياق وخصائص المشروع

السياق وخصائص المشروع						
الرقم	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
١	/					تعمل منظمة المشروع على التعرف على نظام الجودة المتبع في المنظمة المستفيدة عند البدء بتنفيذ المشروع
٢	/					يتم تحديد وبصورة دقيقة عمليات ادارة الجودة في المشروع
٣		/				يتم توثيق المسؤوليات والصلاحيات بصورة دقيقة بين منظمة المشروع والمنظمة المستفيدة
٤		/				يتم تقسيم تنفيذ المشروع الى مراحل (دورة حياة المشروع) متمثلة بانشطة متسلسلة
٥			/			يتم تقسيم عمليات تنفيذ المشروع الى مجموعة من العمليات الضرورية لأداء المشروع
٦				/		يتم اعداد تقارير عن عمليات تنفيذ المشروع بصورة دورية
٧					/	يتم اتخاذ اجراءات تصحيحية بناء على التقارير المرفوعة من قبل الادارة
٠	١	٢	٣	٤	٥	الاوزان
٢			١	٢	١	النكرار
٢			٣	٨	٥	النتيجة
٣،٤٣					معدل التطبيق	
٠،٥٧					النسبة المئوية	
٠،٤٣					حجم الفجوة	

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على اجابات الافراد عينة البحث

يوشر الجدول ٤ حصول الشركة المبحوثة على (٦) نقاط لفقرة تتعلق بقيامهم باتخاذ اجراءات تصحيحية بناءً على التقارير المرفوعة من قبل الادارة، كما حصلت على (٥) نقاط عن اعداد القارير عن عمليات تنفيذ المشروع بصورة دورية، كما حصلت على (٨) نقاط عن فقرتي توثيق المسؤوليات والصلاحيات بصورة دقيقة بين منظمة المشروع والمنظمة المستفيدة، وتقسيم عمليات تنفيذ المشروع على مجموعة من العمليات الضرورية لأداء المشروع، وبذلك فهي تمثل درجة مقاربة لما حصل عليه المتطلب السابق وهو بعيد عن نص الموافقة، اذ بلغ معدل التطبيق (٤٣، ٣) في حين كانت النسبة المئوية لمعدل الالتزام (%) (٥٧) وفجوة مقدارها (%) (٤٣)

* تم استبعاد بعض الفقرات في استلة قائمة الفحص لتشابه المغزى فيها او تناولها ضمن فقرات اخرى ضمن متطلب ادارة الجودة

بـ. فحص متطلب مبادئ ادارة الجودة: كانت اجابات الافراد المبحوثين ازاء مضمون هذا المتطلب كما موضح في الجدول ٥

الجدول ٥

اجابات الافراد المبحوثين حول متطلب مبادى ادارة الجودة

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على احیات الافراد عينة البحث

ويؤشر الجدول ٥ حصول الشركة المبحوثة على (٦) نقاط لفقرة تتعلق ببعضى منظمة المشروع لتلبية متطلبات واحتياجات أصحاب المصلحة الحالية والمأهولة، كما حصلت على (٥) نقاط عن فقرات تتعلق بتحليل المعلومات المتولدة خلال دورة حياة المشروع من أجل استخدامها في التحسين المستمر، كما حصلت على (٨) نقاط عن فقرتين هما تبادل المعلومات والتقارير بين الأطراف المستفيدة من المشروع، وتوثيق الخبرات الناتجة عن المشاريع المنفذة سابقاً، وحصلت على (٣) نقاط لفقرة تقييم اداء المشروع وفق الاهداف المحددة سابقاً، و(٤) نقاط لمستوى سعي المنظمة المستفيدة ومنظمة المشروع الى اجراء عمليات التحسين المستمر في ضوء الوقت والموارد المتاحة وتقييم ترابط وانسياب عمليات المشروع بصورة دورية في حين حصلت فقرتا عملية تقييم التقدم وفقاً لتواتر ايجار زمانية محددة واجراء مقارنة مرجعية في اطار مقاييس محددة لتقييم كفاءة وفاعلية عمليات انشاء المشروع على اقل النقاط واثرت بذلك على نتائج هذا المتطلب اذ بلغ

معدل التطبيق (٣٠٠%) في حين انت النسبة المئوية لمعدل الالتزام (٥٥%) مما شكل فجوة مقدارها (%)٥٠

ت. فحص متطلب عمليات جودة ادارة المشروع: كانت اجابات المبحوثين ازاء مضممين هذا المتطلب كما موضح في الجدول ٦.

الجدول ٦
اجابات الافراد المبحوثين حول متطلب عمليات جودة ادارة المشروع

فحص متطلب عمليات جودة ادارة المشروع (٤:٣)										ت
غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	غير متحقق	
/										١ يتم صياغة ادارة الجودة في المشروع بالاعتماد على نظام الادارة المتبعة المنظمة المستفيدة
					/					٢ في حالة استخدام طرف خارجي لأجراء بعض العمليات يتم مراقبته من قبل منظمة المشروع
	/									٣ تجري منظمة المشروع الطرف الخارجي المتعاقد معها على الالتزام بنظام الجودة المتبوع
				/						٤ تطلب منظمة المشروع تقارير دورية موثقة من الطرف الخارجي المتعاقد لضمان فعالية التخطيط والرقابة والتحسين المستمر
٠	١	٢	٣	٤	٥	٦				الوزان
١		١		١		١				النكرار
		٢		٤		٥				النتيجة
٢،٧٥										معدل التطبيق
٠،٤٦										النسبة المئوية
٠،٥٤										حجم الفجوة

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على اجابات الافراد عينة البحث

يوضّح الجدول ٦ حصول الشركة المبحوثة على (٥) نقاط لفقرة تتعلق في حالة استخدام طرف خارجي لأجراء بعض العمليات سوف تقوم منظمة المشروع بعملية مراقبة وقياس مستوى الجودة له، كما حصلت على (٤) نقاط على كون منظمة المشروع تطلب تقارير دورية موثقة من الطرف الخارجي المتعاقد لضمان فعالية التخطيط والرقابة والتحسين المستمر، بينما حصلت على نقطتين عن فقرة اجراء منظمة المشروع الطرف الخارجي المتعاقد معها على الالتزام بنظام الجودة المتبوع، كما تحصلت فقرة (يتم صياغة ادارة الجودة في المشروع بالاعتماد على نظام الدارة الجودة المتبوع المنظمة المستفيدة) على صفر من النقاط، وهذا اثر كبيراً على مستوى تطبيق هذا المتطلب والسبب لا يعود الى الشركة المبحوثة فقط ولكن يعود لعدم وجود نظم جودة واضحة ومعرفتها لدى المنظمات المستفيدة، وبلغ معدل التطبيق (٢،٧٥) بينما كانت النسبة المئوية لمعدل الالتزام (%)٤٦ وفجوة مقدارها (%)٤٠ وهو بعيد جداً عن نص المعاصفة.

ث. فحص متطلب خطة الجودة للمشروع: كانت اجابات المبحوثين ازاء مضممين هذا المتطلب كما موضح في الجدول ٧.

الجدول ٧
اجابات الافراد المبحوثين حول متطلبات خطة الجودة للمشروع

فحص متطلبات خطة الجودة للمشروع (٤،٤)	ت
١ توجد مجموعة خطط لإدارة الخطر تضمن تحديه في مراحل مختلفة	/
٢ يتم تحديد المخاطر المتعلقة بالتكليف والجودة والوقت وسرعة المعلومات والمخاطر البيئية بصورة دقيقة	/
٣ هناك قادر متخصص لإدارة المخاطر	/
٤ يتم توثيق المخاطر وكافة تأثيراتها المتوقعة	/
٥ يتم تقييم التقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر بصورة دورية	/
٦ يتم استخدام معايير كمية ونوعية لتقدير المخاطر	/
٧ الأطراف المسؤولة عن توفير احتياجات المشروع محددة بصورة دقيقة	/
٨ يتم تقييم المجهزين بصورة دورية من أجل استبعاد السبعين منهم	
الوزان	٠ .١
النكرار	٤ .٢
النتيجة	٠ .٢
معدل التطبيق	١،٣٨
النسبة المنوية	٠،٢٣
حجم الفجوة	٠،٧٧

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على اجابات الافراد عينة البحث

ويوضح الجدول ٧ حصول الشركة المبحوثة على (٥) نقاط لفقرة تتعلق بتقييم المجهزين بصورة دورية من أجل استبعاد السبعين منهم، كما حصلت على (٤) نقاط عن فقرة كون الاطراف المسؤولة عن توفير احتياجات المشروع محددة بصورة دقيقة، كما حصلت على (٢) من النقاط عن فقرتين مما تحدد المخاطر المتعلقة بالتكليف والجودة والوقت وسرعة المعلومات والمخاطر البيئية بصورة دقيقة و فقرة استخدام معايير كمية ونوعية لتقدير المخاطر، في حين حصلت اربع فقرات على صفر من النقاط والتي جعلت هذا المتطلب هو الضعف والبعد عن نص الموصافة من حيث التطبيق واثرة على نتائج المتطلبات الأخرى، والقرارات هي على التوالي، توجد مجموعة خطط لإدارة الخطر تضمن تحديه في مراحل مختلفة، هناك قادر متخصص لإدارة المخاطر، يتم توثيق المخاطر وكافة تأثيراتها المتوقعة، وأخيراً يتم تقييم التقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر بصورة دورية، ويبلغ معدل التطبيق (١،٣٨) في حين كانت النسبة المئوية لمعدل الالتزام (٢٣٪)، مما شكل فجوة مقدارها (٧٧٪).

في ضوء ما جاء بالجدول (٣،٤،٦،٧) يمكن أن نلخص معدل التطبيق لمتطلبات الموصافة والنسبة المئوية لمعدل الالتزام بها والفجوات القائمة بين الواقع الفعلي للشركة المبحوثة مع متطلبات الموصافة المبحوثة بالجدول ٨:

الجدول ٨

خلاصة تقييم اعتماد متطلبات فحص الشركة المبحوثة

نسبة الفجوة	النسبة المئوية لمعدل الالتزام	معدل التطبيق	المتطلبات	ت
٠,٤٣	٠,٥٧	٣,٤٤	الشروط والتعرifات	١
٠,٤٣	٠,٥٧	٣,٤٣	السياق وخصائص المشروع	٢
٠,٥٠	٠,٥٠	٣,٠٠	مبادئ ادارة الجودة	٣
٠,٥٤	٠,٤٦	٢,٧٥	عمليات جودة ادارة المشروع	٤
٠,٧٧	٠,٢٣	١,٣٨	خطة الجودة للمشروع	٥
٠,٥٤	٠,٤٦	٢,٨	المعدل الكلي لتطبيق المواصفة	

المصدر: من إعداد الباحث

من ملاحظة الجدول ٨ يتبين وجودة فجوات كبيرة بين التطبيق الفعلي للشركة المبحوثة وبين نصوص متطلبات المواصفة التي اعتمدتها الباحث وهذا يدعونا الى قبول فرضية البحث التي تنص "لا تتوافق متطلبات نظام جودة ادارة المشروع في الشركة المبحوثة"

الاستنتاجات والمقررات

من خلال ملاحظة الجانب العملي للبحث توصل الباحث الى الاستنتاجات الآتية:

- تحتل جودة ادارة المشروع اهمية كبيرة في الوقت الحاضر وذلك بسبب حجم الاموال التي يتم صرفها او تخصيصها على المشاريع والدليل هو عدد المواصفات التي تناولت هذا الموضوع سواءً على صعيد المنظمة الدولية للمواصفات (ISO) أو معهد المواصفات البريطاني BSI.
- تسهم المواصفة المبحوثة في نقل المعرفة والخبرات بين المشاريع والمنظمات الرائدة والناشرة في مجال ادارة المشاريع وانشائها.
- يؤدي استخدام المواصفة الى أن تكون العروض المقدمة من قبل الشركة واقعية وأكثر كفاءة وفاعلية في عملية الحصول على المناقصات.
- المواصفات الفنية والتقنية موجودة في الشركة المبحوثة ولكن سبب انخفاض معدل التطبيق هو عدم التوثيق الذي يعد جوهر المواصفة قيد البحث.
- الاطراف المستفيدة من الشركة قيد البحث لا تمتلك نظام جودة معترف به عالمياً كنظام ISO9001) أو غيره وبالتالي لا تحتاج الشركة الى التنسيق معهم في هذا المجال، وهذا ادى الى عدم توجيه الشركة الى الحصول عليه او على المواصفة قيد البحث.
- الشروط العامة للمقاولات الملزمة من قبل الحكومة العراقية لا تلزم الشركات بالحصول على المواصفة المبحوثة او أي مواصفة متخصصة في هذا المجال، وهذا ادى الى انخفاض المعدل الكلي لتطبيق المواصفة.
- حققت فقرة الشروط والتعرifات في الشركة المبحوثة نسبة مئوية للاقفاق بلغت (٥٧%) وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئياً وموثق كلياً" وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات الشروط والتعرifات الواقع الفعلي مقدارها (٤٣%)، وذلك نتيجة عدم تحديد المعايير الدقيقة لتقييم الانجاز وعدم وجود خطط للسلامة والامان.
- حققت فقرة السياق وخصائص المشروع في الشركة قيد البحث نسبة مئوية للاقفاق بلغت (٥٧%) وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئياً وموثق كلياً" وهذا يشير الى

- وجود فجوة بين متطلبات السياق وخصائص المشروع والواقع الفعلي مقدارها (٤٣٪)، وذلك بسبب عدم وجود تحديد دقيق لعمليات الجودة وعدم وجودة نظام جودة في الاطراف المستفيدة.
٩. حققت فقرة مبادئ ادارة الجودة نسبة مؤوية للاتفاق بلغت (٥٠٪) وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئياً موثقاً كلياً" وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات مبادئ ادارة الجودة والواقع الفعلي مقدارها (٥٠٪)، وكان سببها عدم وجود مقارنة مرجعية في اطار مقاييس دقيقة لكفاءة عمليات انشاء المشروع.
١٠. حققت فقرة عمليات جودة ادارة المشروع نسبة اتفاق بلغت (٤٦٪) وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئياً موثقاً جزئياً" وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات فقرة عمليات جودة ادارة المشروع والواقع الفعلي مقدارها (٥٤٪)، وهذا بسبب عدم تطبيق الشركة المبحوثة لنظام جودة تجبر الاطراف الخارجية على تطبيقه.
١١. حققت فقرة خطة الجودة للمشروع نسبة مؤوية للاتفاق بلغت (٢٣٪) وبذلك تكون الفقرة واقعة في درجة تقييم "مطبق جزئياً غير موثقاً" وهذا يشير الى وجود فجوة بين متطلبات فقرة خطة الجودة للمشروع والواقع الفعلي مقدارها (٧٧٪)، وهذه الفجوة الكبيرة سببها عدم وجود ادارة للمخاطر تقوم بمهمة التخطيط والتوثيق والتطبيق والتقييم للتطبيق، وهذه النتيجة انعكست على معدل التطبيق العام للمواصفة.
١٢. النسبة المؤوية المتحقق من مقارنة جودة ادارة المشروع في الشركة المبحوثة مع المواصفة (ISO60001:2017) بجميع فقراتها بلغت (٤٦٪) وهي تقترب من "مطبق جزئياً موثقاً جزئياً" مما يشير الى فجوة مقدارها (٥٤٪)، وهذا الامر يستدعي المعينين على التفكير الجدي بتطبيق المواصفة وتوثيقها.
- ثانياً- المقترنات**
- بناءً على الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث يقترح على إدارة الشركة المبحوثة ما يأتي:
١. على إدارة الشركة قيد البحث السعي للحصول على المواصفة الدولية (ISO10006:2017) وتوظيف كادر متخصص لإدارة الجودة في الشركة بهذا الشأن.
 ٢. تعد المواصفة الدولية (ISO10006:2017) لغة عالمية للتعامل بين الطرف المستفيد من المشروع والطرف المنفذ، وهذا يوجب على الطرف المستفيد (الذي يمنح المقاولات للشركة) الاطلاع عليها والتفكير الجدي لتطبيقها.
 ٣. على الشركة قيد التركيز على إدارة المخاطر، وذلك لأهميتها العالية، لأنها سبب انخفاض النسبة المؤوية لمعدل تطبيق متطلب "خطة الجودة للمشروع" والذي انعكس بشكل كبير على النسبة المؤوية الكلية لتطبيق المواصفة فيها.
 ٤. ضرورة تعاقد ادارة الشركة المبحوثة مع الجهات المختصة من أجل الحصول على (ISO9001) والذي يسهم في رفع مستوى التوثيق في كل انشطتها.
 ٥. يجب الزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية العراقية بالحصول على المواصفة الدولية (ISO9001) لما له من الاهمية في تعريف هذه الجهات على مديات قوتها وضعفها، فتعمل على تطويرها لكونها تركز على التحسين المستمر، ونقل من مستوى الاطباء في التخطيط والتنفيذ.
 ٦. على الجهات الحكومية العراقية المختصة في مجالات الانشاءات والمقاولات تعديل الشروط العامة للمقاولات بإضافة شرط الحصول على هذه المواصفة او المواصفات المشابهة لها عند تشكيل اي شركة للمقاولات واعتبارها شرطاً من شروط احاله المشاريع اليها.

المصادر

1. Cgiar, Internal Audit Unit, 2017, Project Management, Good Practice Note, Smb-Arc-08, Project Management, Good Practice Note, Smb-Arc-08, Version:July2017 Https://Www.CGIAR.Org/Wp/WpContent/Uploads/2018/01/Gpn_Project-Management-July-2017.Pdf
2. Cronin, Pat, 2015, Project Request And Approval Process, Bridgewater State University, Information Technology, Project Request And Approval Process, <Https://My.Bridgew.Edu/Departments/Itprojectmanagementoffice/Shared%20documents/Project%20request%20and%20approval%20process.V1.6%20final%2002202015.Pdf>
3. Giménez, Lucas Gabriel, 2008, Modelo De Gestión De Calidad En Proyectos De Investigación Y Desarroll En El Mmbito De La Universidad Tecnológica Nacional Acorde A La Norma Internacional Iso 10006: 2003, Avaliação, Campinas; Sorocaba, Sp, V. 13, N. 1, P. 169-191, Mar. 2008, <Http://Www.Scien.Br/Pdf/Aval/V13n1/A10v13n1.Pdf>
4. International Standard Iso: 21500, First Edition, 2012-09-01, Guidance On Project Management, Lignes Directrices Sur Le Management De Projet, Copyright International Organization For Standardization, Provided By Ihs Under License With Iso Licensee = Isatis Group <Http://St2014.Ir>, No Reproduction Or Networking Allowed Without License From Ihs Not For Resale, 06/16/2013 21:40:00 Mdt, Reference Number, Iso 21500: 2012 (E), <Https://Www.Iso.Org/Standard/50003.Html>
5. International Standard,ISO:10006,Third Edition, 2017, Quality Management - Guidelines For Quality Management In Projects, Management De La Qualité - Lignes Directrices Pour Le Management De La Qualité Dans Les Projets, Reference Number, Iso 10006: 2017 (E), © Iso2017, PublishedInSwitzerland, <Https://Www.Sis.Se/Api/Document/Preview/922848/>
6. Kristinsdóttir, Lára Kristín, Möller, Eðvald, 2014, Maximizing the Benefits of ISO 21500 Implementation, International Journal of Business and Social Science Vol. 5, No. 9(1); August 2014, © Center for Promoting Ideas, USA, https://www.hi.is/sites/default/files/thbg/vid/maximizing_benefits.pdf
7. Leyva ,Jaime Adrián Millán, Matović, Vladimir, 2011, Project Management Practices At Thefront-End of Management Consulting Projectsan Exploratory Study Of The Perspectives of Swedish Management,Consultants Umeå School of Business, Autumn Semester2011,MasterThesis,One-Year,15Hp, <Http://Www.Projektakademien.Se/Pa/Wp-Content/Uploads/2014/04/4.-Fulltext01.Pdf>
8. Macek, Wojciech, 2010, Methodologies Of Project Management, Opole University Of Technology, Contemporary Economy Magazine, <Http://Ce.Vizja.Pl/En/Download-Pdf/Id/188>
9. Meredith, Jack R, Mantel, Samuel J., Wiley, Nicholas, John M, Steyn, Herman, 2015, Project Management Concepts, Rai Technology University Campus, Dhodballapur Nelmangala Road,Sh-74, Off Highway 207, Dhodballapur Taluk, Bangalore – 561204, E-Mail: Info @ Raitechuniversity. In |Web: <Www.Raitechuniversity>. InHttp://164.100.133.129:81/Econtent/Uploads/Project_Management_Concept.Pdf
- 10.Munns, A K, Bjeirmi, B F, 1996, The Role Of Project Management In Achieving Project Success, International Journal Of Project Management Vol. 14, No. 2, Pp. 81-87, 1996,Copyright © 1996 Elsevier Science Ltd And Ipma, Printed In Great Britain.

- All Rights Reserved,0263-7863 / 96\$ 15.00 + 0.00 Https://Notendur.Hi.Is/Vio1/The_Role_Of_Project_Management_In_Achieving_Project_Success.Pdf
- 11.Nibyiza, Fabiola, 2015, Analysis Of Project Scope Change Management As A Tool, For project Success, Case Study Of Akazi Kanoze Projects, This Research Project Has Been Submitted For Examination With Our Approval As University, Http://Www.Jkuat.Ac.Ke/_Campuses/Kigali/Wp-Content/Uploads/2014/04/Nibyiza-Fabiola-2015-Analysis-Of-Project-Scope-Change-Management-As-A-Tool-For-Project-Success-Case-Study-Of-Akazi-Kanoze-Projects..Pdf
- 12.Pm4dev, 2015, The Project Management Processes, Management For Development Series, Project Management For Development Organizations, Pm4dev Services, Contact Us At: <Info @ Pm4dev.Com,Www.Pm4dev.Com> Info@ Pm4dev.Com <Https://Www.Pm4dev.Com/Resources/Free-E-Books/48-The-Project-Management-Processes/File.Html>
13. Weaver, Patrick, 2016, Towards an International Standard for Project Management, WG1 Convener - Australian Delegation to ISO/PC236 Representing Standards Australia Copyright © Casablanca Management Pty. Ltd. All Rights Reserved., https://mosaicprojects.com.au/PDF-Gen/ISO_PW_Sydney.pdf
- 14.Zandhuis, Anton, Stellingwerf, Rommert, 2013, ISO 21500 /Guidance On Project Management/A P O C K E T G U I D E, Copyright Protected. Use Is For Single Users Only Via A Vhp Approved License, For Information And Printed Versions Please See <Www.Vanharen.Net>, <Https://Www.Vanharen.Net/Samplefiles/9789087538095smpl.Pdf>
